

Umbau und Erweiterung der Grundschule Leuchtenburg



Fertiggestellt zum 31.1.03
Die Einweihung der Räume fand
am 28.3.03 statt.

Überdachter Verbindungsgang



Umbau und Erweiterung des Kindergartens Marienstrasse

Die Arbeiten wurden im Januar soweit fertiggestellt, dass der Kindergarten ab dem 1.2.03 in Betrieb genommen werden konnte.



Zwischenzeitlich wurde auch der Spielplatz fertiggestellt.



Sanierung der Wasseraufbereitung im Hallenbad



Die alten Filter wurden bereits entfernt.
Die neuen Filter werden in der 30. KW
geliefert.

Die Arbeiten sollen bis Ende August
fertig gestellt sein.



Einbau einer Rutsche im Hallenbad



Zur Zeit werden vorbereitende Arbeiten wie z. B. Einbau von Betonfundamenten usw. ausgeführt. Ab 28.7. Soll die Rutsche montiert werden.

Nach dem Aufbau der Rutsche sollen die Fliesenarbeiten ausgeführt werden.



Freibad Rastede

Attraktivitätssteigerung



Im Frühjahr dieses Jahres wurden die Umkleibereiche modernisiert und die Duschen saniert.



Brandschaden Sporthalle

Feldbreite



Die Dacheindeckung über dem alten Teil der Halle wird erneuert.

Nach dem Einbau der Lichtkuppeln soll in Kürze mit den Innenausbauarbeiten begonnen werden.



Wohnanlage Wahnbek



Der brandgeschädigte Gebäudeteil Jadestr. 10 A ist wiederhergestellt

.

Jugendraum Delfshausen



Die Baugenehmigung zur Nutzungsänderung wird in Kürze erwartet.



Fenstersanierung Altbau Schule Loy



Die Arbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt

Fenstersanierung Werkbereich Schule Voßbarg




Die Arbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt

Renovierung naturwissenschaftlicher Räume KGS

Die Arbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt

Musterschaltschrank Pumpstationen Rastede im Bereich der EWE

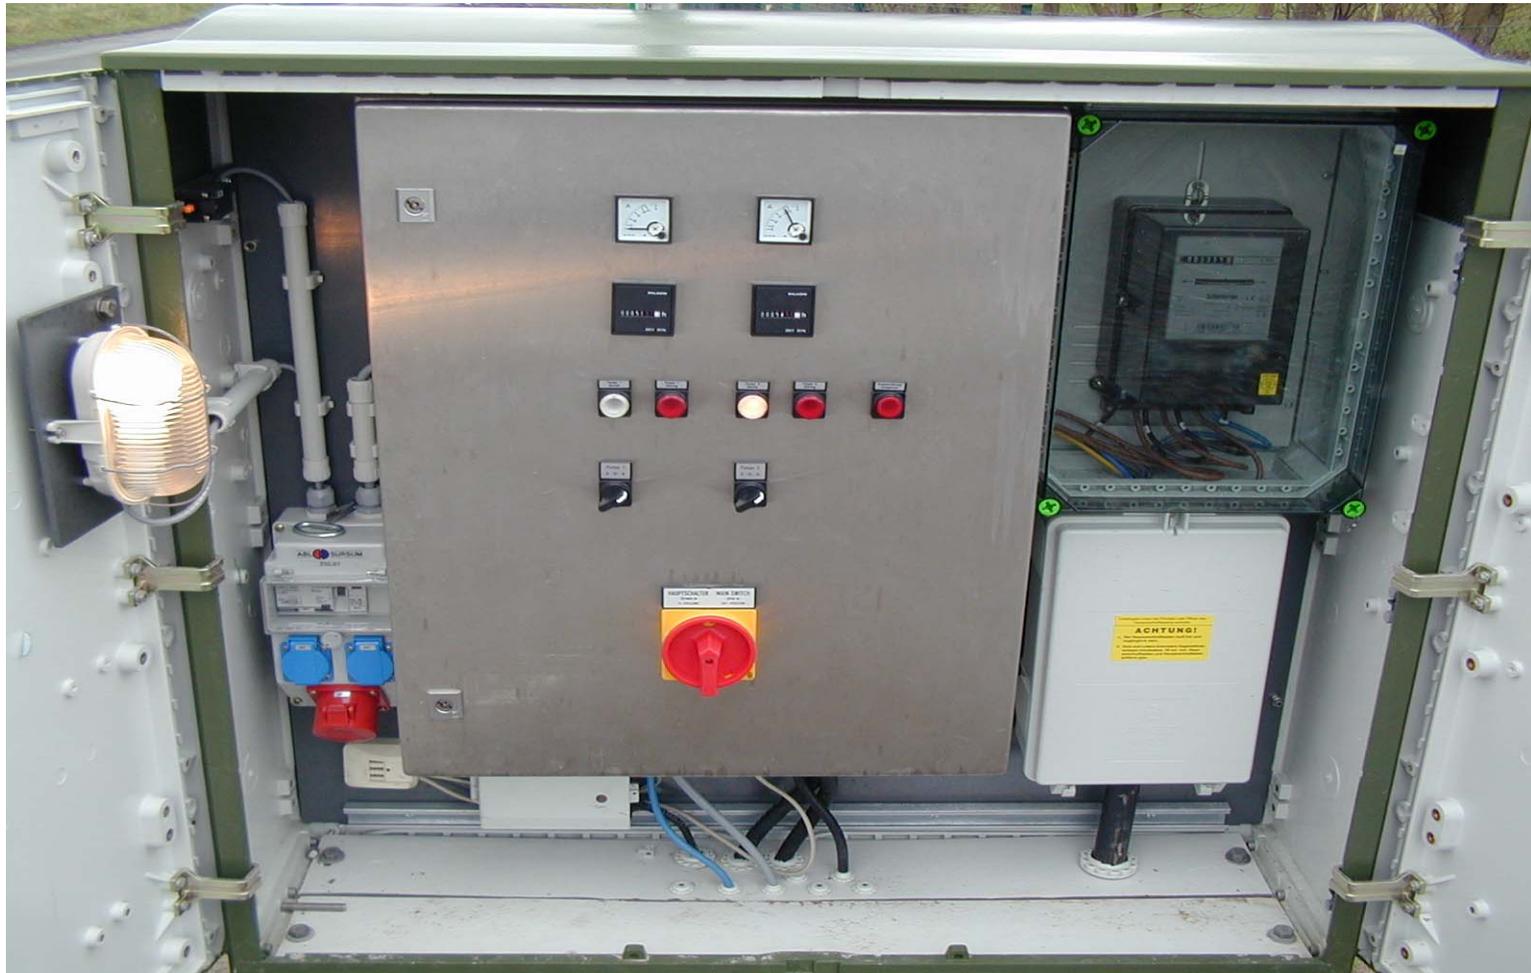

Der 2. Bauabschnitt „Umbau der Pumpstationen auf Fernwirktechnik“ wird in der 28. KW abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung der Leitzentrale auf der Kläranlage im Vorjahr sind danach alle Pumpstationen hier aufgeschaltet und werden permanent überwacht / geregelt.

**Funktionsbeschreibung und Anlagenbilder können unter folgendem Pfad abgerufen werden:
I:\ Beamer\Ratsbericht July 2003\Pumpwerke**

Ausbau August-Brötje-Straße / Schloßstraße



Die Maßnahme ist Ende April 2003 fertiggestellt worden.

Als abschließende Maßnahme fehlt noch der BÜ Schloßstraße

Ausbau August-Brötje-Straße / Schloßstraße



Die Torpfeiler und Zaunanlage sind in der 26. KW aufgestellt worden. Damit sind die Arbeiten für die Wiederherstellung des Palaisgarten abgeschlossen.

Baugebiet Nr. 62 - Hochbornteich



Die Bauarbeiten für den Endausbau sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Die ausführende Baufirma ist zur Zeit dabei Mängel zu beheben und Restarbeiten durchzuführen. Voraussichtliche Fertigstellung ist Ende Juli 2003.

Die Bepflanzung des Gebietes ist abgeschlossen. Seitens der Anwohner gibt es eine große Bereitschaft die Pflege der Pflanzbeete zu übernehmen.

Zur Zeit gibt es noch sechs freie Bauplätze.

Baugebiet Nr. 63 A - Erschließung Donaustraße



Die Bauarbeiten für den Endausbau, sowie die Bepflanzung des Gebietes sind abgeschlossen. Seitens der Anwohner gibt es eine große Bereitschaft die Pflege der Pflanzbeete zu übernehmen.

Es gibt keine freien Bauplätze mehr.

Baugebiet Nr. 63 B - Erweiterung Donaustraße



Die Bauarbeiten für die Ersterschließung sind bereits im letzten Jahr abgeschlossen worden. Zur Zeit werden auf den Grundstücken die Wohnhäuser errichtet. Der Endausbau dieses Teilgebietes kann erst nach Ersterschließung des neuen Wohnbaugebietes Nr. 63 c erfolgen, da über diese Trasse der Baustellenverkehr in das Gebiet erfolgen soll.

Alle sechs Bauplätze sind vergeben.

Baugebiet Nr. 63 c - Willehadstraße



- Erschließungsbeginn für die 18 gemeindeeigenen Baugrundstücke voraussichtlich 01.08.2003
- Fertigstellung der Ersterschließung Ende September 2003
- Für die 18 Baugrundstücke liegen zur Zeit 51 Bewerbungen vor. Die Veräußerung der Grundstücke soll bis Mitte September abgeschlossen sein.

Baugebiet Nr. 49a - Osterbergstraße



- Erschließungsbeginn für die 13 gemeindeeigenen Baugrundstücke voraussichtlich 01.08.2003
- Fertigstellung Ende September 2003
- Es liegen zur Zeit für die 13 Baugrundstücke 47 Bewerbungen vor. Die Veräußerung der Grundstücke soll bis Mitte September abgeschlossen sein.

Sanierung: Mollberger Weg



- Sanierung der Fahrbahndecke und Einbau einer Straßenentwässerung
- Fertigstellung Ende Juli 2003
- Zur Zeit werden die Arbeiten an der Straßenentwässerung durchgeführt. Bei guter Witterung soll Dienstag den 8. Juli die Fahrbahndecke fertig gestellt werden. Anschließend wird die Entwässerungsmulde hergestellt.
