

## Maßnahmen zur Ertüchtigung der Turnierbahnanlage


Bei der Kostenermittlung handelt es sich um überschlägige Kosten; Nebenkosten (Planungshonorar, Fachgutachten etc.) sind nicht enthalten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Zweck	Kosten in €	Umsetzungszeitraum	Bedingung
1	Entfernung Vielseitigkeitwall	Flächengewinn	10.000	2018	
2	Entwässerungssituation Ellernteichkurve / ehem. Sportplatzfläche verbessern	Verbesserung der Untergrundsituation im Bereich der Ellernteichkurve	9.000	2018	
3	Verbesserung der Bodenverhältnisse westlich des Dressurvierecks Turnierplatz	Verbesserung der Wasserablaufsituation und damit des Zustandes der Schlosskurve	4.000	2018	Der Bauhof wird zunächst durch eine Intensivierung der Tiefenlockerung versuchen, eine Verbesserung der Situation zu erreichen
4	Verbesserung der Ablaufsituation des Wassers beim Dressurvierecks westlich des Turnierplatzes	Verbesserung des Zustandes der Fläche, da in einer Senke sehr viel Wasser gesammelt wird	3.000	2018	
5	Überprüfung der Standortsituation Stromkästen	Flächengewinn für den Aufbau von Zelten und Infrastruktur	Ca. 5.000	2018	Folgemaßnahmen aus der Platzgestaltung der Tribünenwiese

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Zweck	Kosten in €	Umsetzungszeitraum	Bedingung
6	Erweiterung des Wegesystems	Verbesserung der Zufahrtssituation; Verhinderung des Befahrens von sensiblen Flächen	60.000	Folgejahr(e)	Voraussetzung ist die Bearbeitung des Untergrundes auch in Abhängigkeit zu Tribünenwiese; die Kosten beinhalten auch die Erweiterung der Wegesituation westlich der Birkengruppe und südwestlich des Wegeareals. Die Befahrung der Flächen kann südlich der Tribünenwiese bereits 2018 erfolgen.
7	Neuprofilierung der Tribünenwiese	Erhöhung des Wasserabflusses, der Wasseraufnahmegängigkeit und damit der besseren Nutzbarkeit des Platzes.	150.000	Folgejahr(e)	Voraussetzung ist die abschließende Erstellung eines Nutzungskonzeptes unter Berücksichtigung der Sportplatzfläche (ehem. FC), sowie die Einwerbung von Zuschüssen Dritter (LEADER; RRV)
8	Anpflanzung	Ersatzanpflanzung für abhängige Gehölze	22.000	Folgejahr(e)	Voraussetzung ist die Entfernung der Birkengruppe
9	Drainageabflüsse verbessern	Bessere Möglichkeit der Wartung und Unterhaltung der Drainageabflüsse im Mittelgraben	11.000	Folgejahr(e)	Maßnahme würde den Abschluss der Drainageverbesserung im südwestlichen Teilbereich der Turnierplatzanlage bedeuten

10	Veränderung der Lage des Abreiteplatzes	Verbesserung der Herrichtung des Abreiteplatzes	Nicht bekannt	Folgejahr(e)	Frühestens im Zusammenhang mit der Erweiterung des Wegesystems und der Entfernung der Birkengruppe
11	Verbesserung der Fläche (vgl. Lageplan-Nr. 11)	Verbesserung der Untergrundsituation, um	40.000	Folgejahr(e)	Verringerung der Inanspruchnahme
12	Veränderung von Pflegemaßnahmen durch den Bauhof im Bereich der Tribünenwiese	Änderung der Wasseraufnahme- und Wasserdurchlässigkeitsqualität	Kosten im Unterhaltungsbereich	2018	Ersatz für Mulchmähd wird geprüft; Veränderung bei der Tiefenlockerung

# Turnierplatz

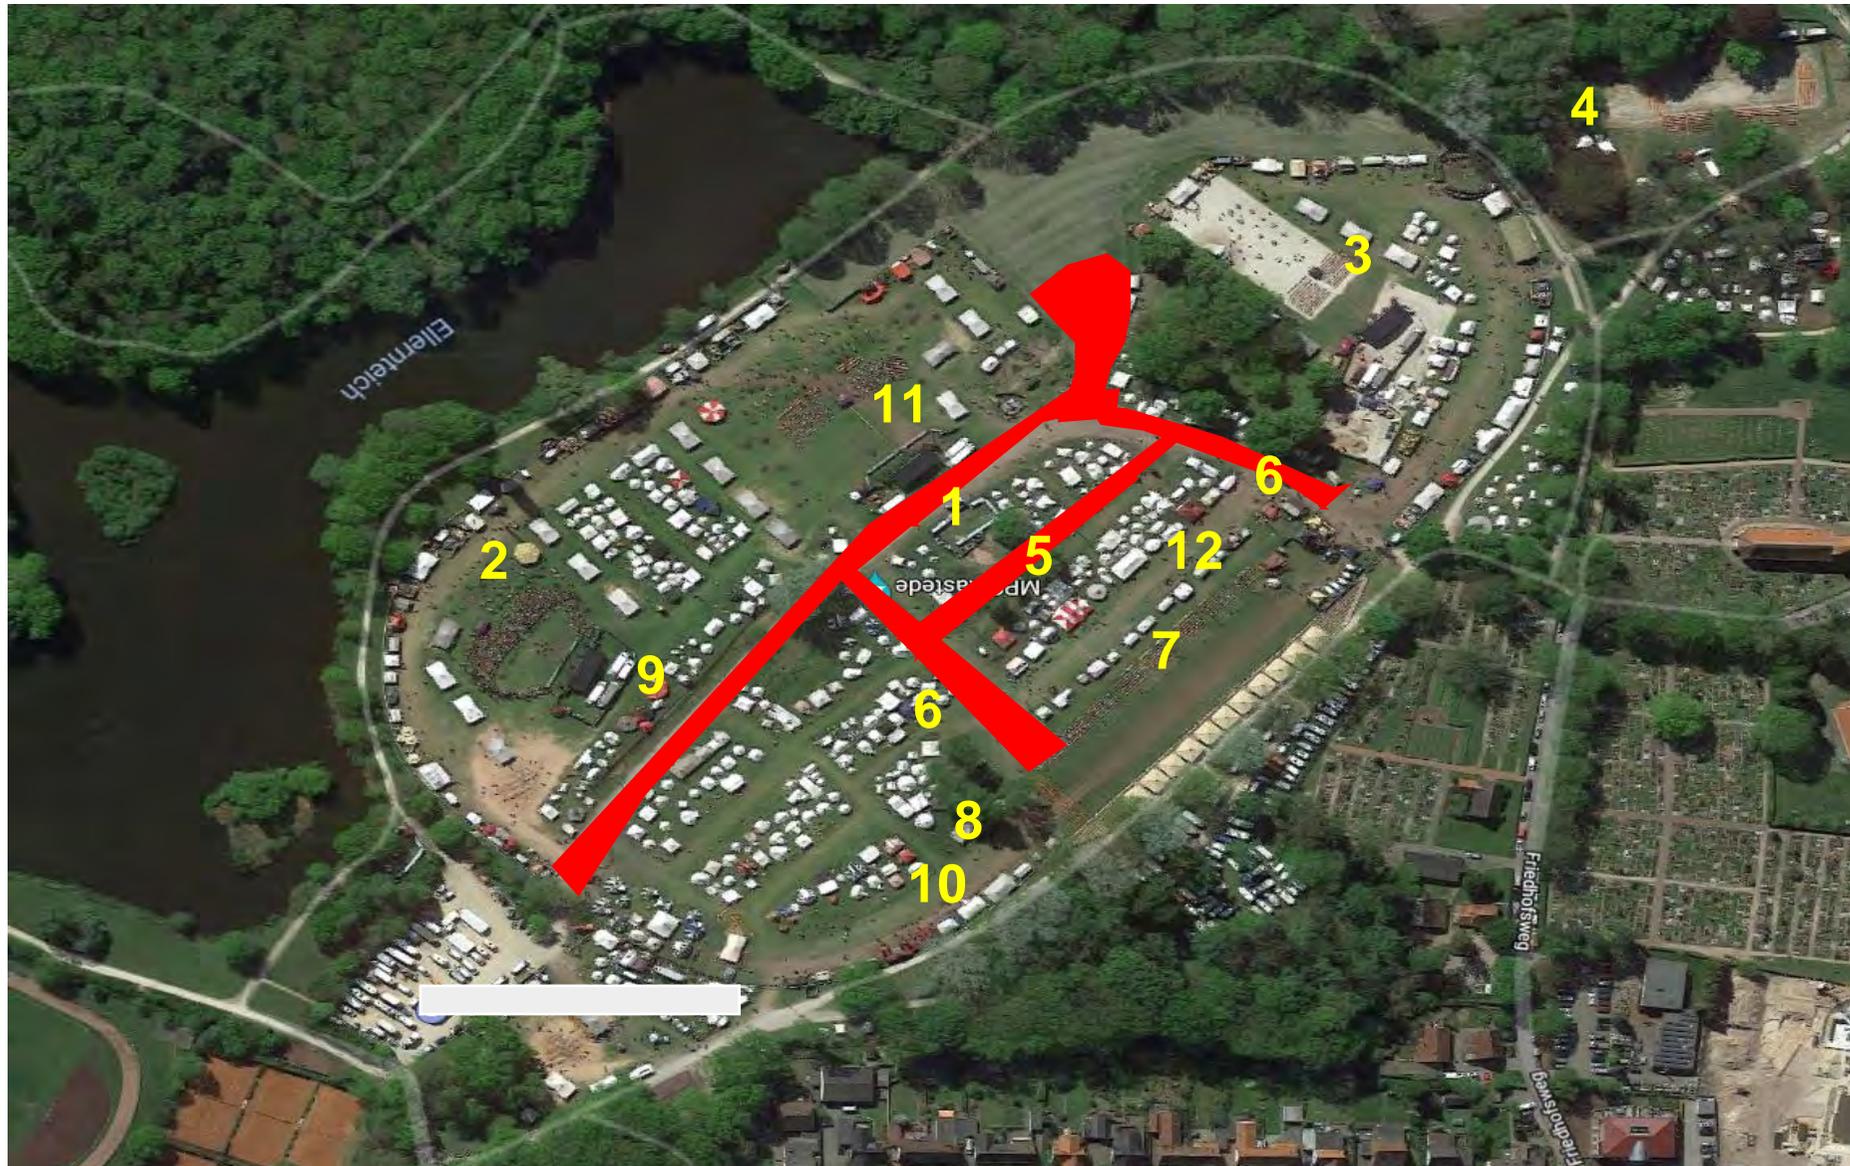

 Wegesystem, zum Teil erweitert - Ziffern 1 bis 12 vgl. Sach- und Rechtslage
